

Le Live View (v6 et v7)

Conception du Phasage


- Introduction
- Gestion des plans
- Gestion du SIG
- Gestion des zones et axes
- Les catégories de zone (nouveau v7)
- Gestion des zones d'impression
- Gestion des activités
- Gestion des objets connectés
- Les pictogrammes mobiles
- Le diagramme de Gantt
- **Le Live View (v6 et v7)**

En quelques mots

Le Live View vous permet créer des visualisations 2D de votre projet et de les exporter en vidéo.


Accès

Accédez au Live View depuis l'onglet Conception.

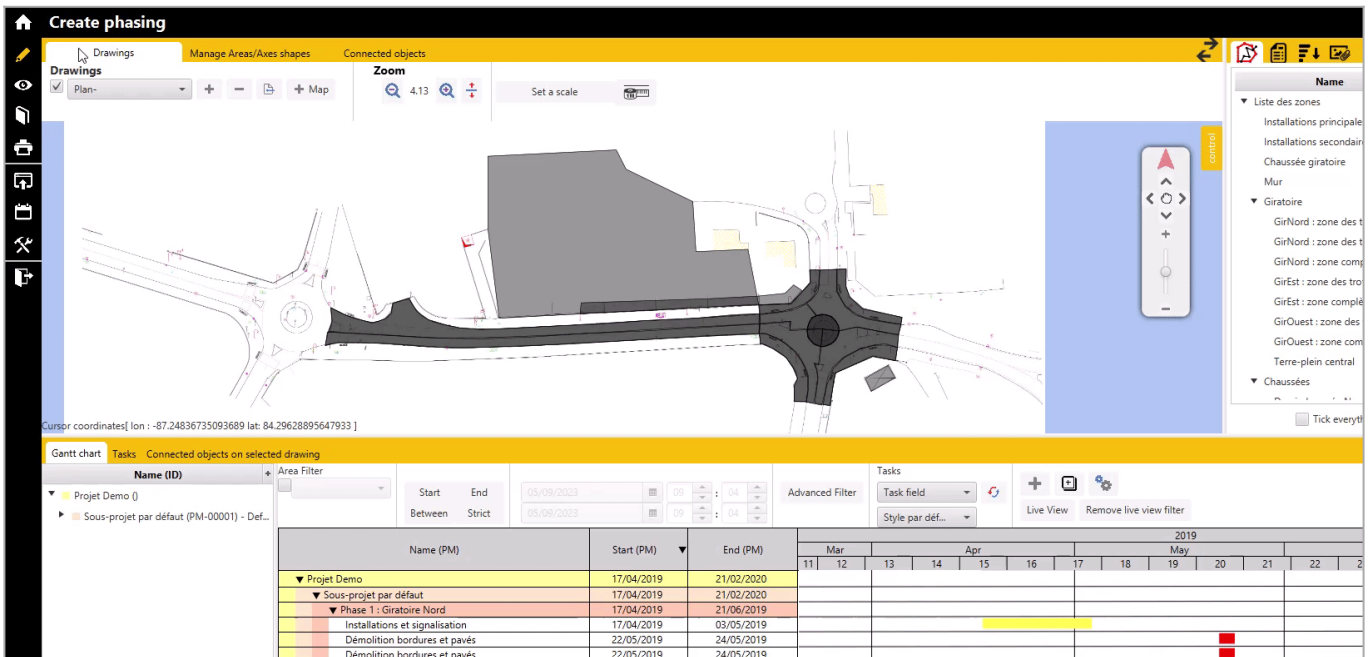


The screenshot displays the 'Create phasing' interface. The top section shows a 2D site plan with various zones and axes. The bottom section features a Gantt chart with the following data:

Name (PM)	Start (PM)	End (PM)
Projet Demo	17/04/2019	21/02/2020
Sous-projet par défaut	17/04/2019	21/02/2020
Phase 1 : Giratoire Nord	17/04/2019	21/06/2019
Installations et signalisation	17/04/2019	03/05/2019
Démolition bordures et pavés	22/05/2019	24/05/2019
Démolition bordures et pavés	22/05/2019	24/05/2019

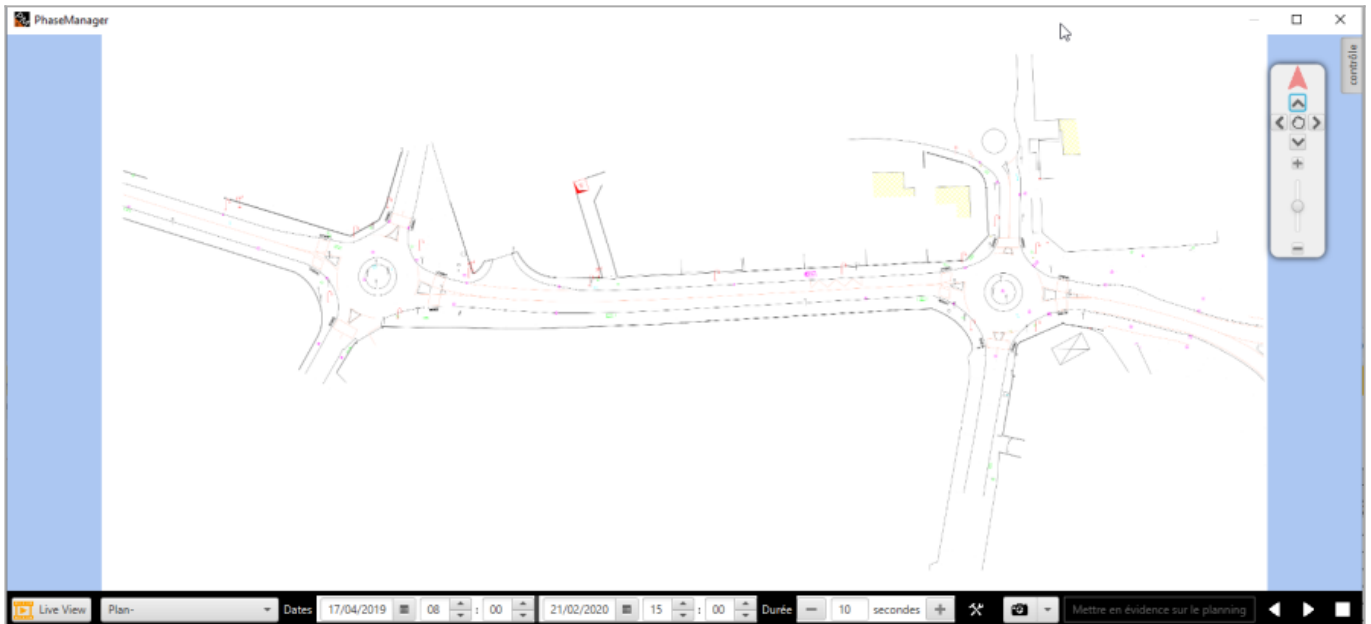

Lecture de votre projet

Visualisez votre projet en cliquant sur le bouton Lecture ► en bas à droite. Vous pourrez Visualiser une période plus précise en renseignant les dates de début – fin de la visualisation, et en indiquant la durée de celle-ci (par défaut réglée sur 10 secondes). Affichez un autre plan en choisissant celui voulu dans la liste déroulante à gauche.




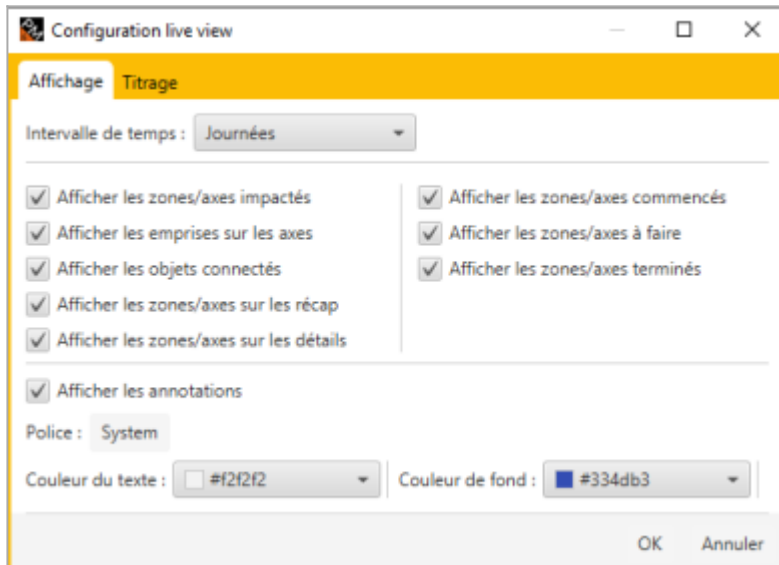
Partie Gantt

Le Live view s'ouvre dans une fenêtre à part de Phase Manager. Vous pouvez donc visualiser votre Gantt sur Phase Manager en même temps (il est conseillé d'avoir 2 écrans). Une fois le Live View ouvert, un curseur apparaîtra dans votre Gantt. Sa taille correspond à l'intervalle de temps pour la période affichée sur le Live View, et son emplacement aux dates de cette période. Il est possible de modifier l'intervalle de temps et l'emplacement du curseur manuellement. Toutefois lors de la lecture, le curseur reprendra les paramètres renseignés. Les filtres renseignés dans votre Gantt sont également appliqués dans le Live View.

Paramètres


Affichage

Vous pouvez modifier les paramètres du Live View via le bouton Paramètres . Cette fenêtre vous permet de configurer les objets/annotations à afficher sur lors de la lecture, ainsi que l'intervalle de temps pour celle-ci.



Titrage

L'onglet Titrage vous permet d'afficher le nom du sous-projet lors de la lecture.

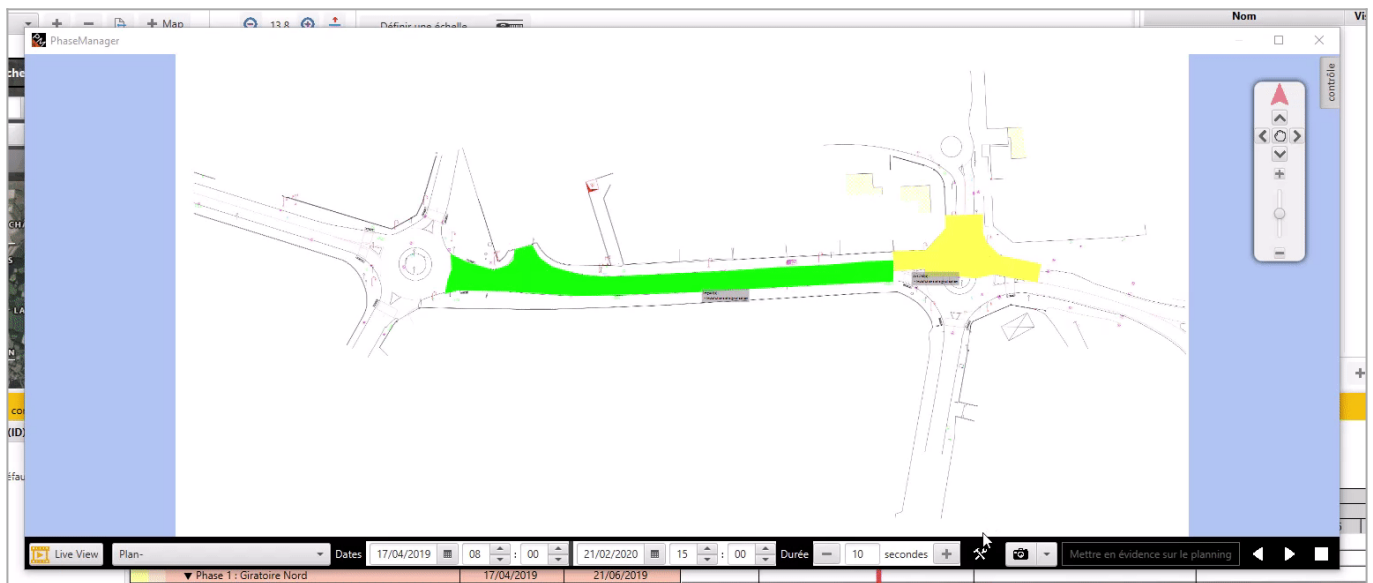

Capture

Faites pause lors de la lecture et faites une capture d'écran de votre phasage à un moment précis en

cliquant sur le bouton



Mettre en évidence

Faites pause lors de la lecture et mettez en évidence dans votre Gantt les activités concernées à ce



Transition

Ajouter une transition en cliquant sur un plan. Vous pourrez modifier la transition Avant et Après si un plan se trouve avant ou après celui sélectionné. Vous pouvez également diminuer ou agrandir la durée de la transition en bougeant le curseur directement sur la représentation de la transition.

Name (PM)	Start (PM)	End (PM)	2019																			
			Mar	12	13	14	Apr	15	16	17	18	May	19	20	21	22	Jun	23	24	25	26	27
▼ Projet Demo	17/04/2019	21/02/2020																				
▼ Sous-projet par défaut	17/04/2019	21/02/2020																				
▼ Phase 1 : Giratoire Nord	17/04/2019	21/06/2019																				
Installations et signalisation	17/04/2019	03/05/2019																				
Démolition bordures et pavés	22/05/2019	24/05/2019																				
Démolition bordures et pavés	22/05/2019	24/05/2019																				
Fraisage et dégrappage du bord	27/05/2019	29/05/2019																				
Fraisage et dégrappage du bord	27/05/2019	29/05/2019																				
Elargissement chaussée + fouilles + canalisations	30/05/2019	31/05/2019																				
Elargissement chaussée + fouilles + canalisations	30/05/2019	31/05/2019																				
Services, enrobages et remblayages des fouilles + str...	05/06/2019	07/06/2019																				
Services, enrobages et remblayages des fouilles + str...	05/06/2019	07/06/2019																				
Pose de bordures et pavés	07/06/2019	07/06/2019																				
Pose de bordures et pavés	07/06/2019	07/06/2019																				
Réglage terre végétale	11/06/2019	11/06/2019																				
Réglage terre végétale	11/06/2019	11/06/2019																				
Fraisage de chaussée	12/06/2019	13/06/2019																				

Exporter la vidéo

Vous pouvez exporter la vidéo créée en cliquant sur le bouton Exporter la vidéo en bas à gauche puis en cliquant sur Démarrer. Vous pourrez modifier le nom que portera la vidéo ainsi que le chemin où elle sera enregistrée sur votre PC. Définissez la qualité de votre vidéo. Plus la qualité est élevée, plus la vidéo prendra de place.

