


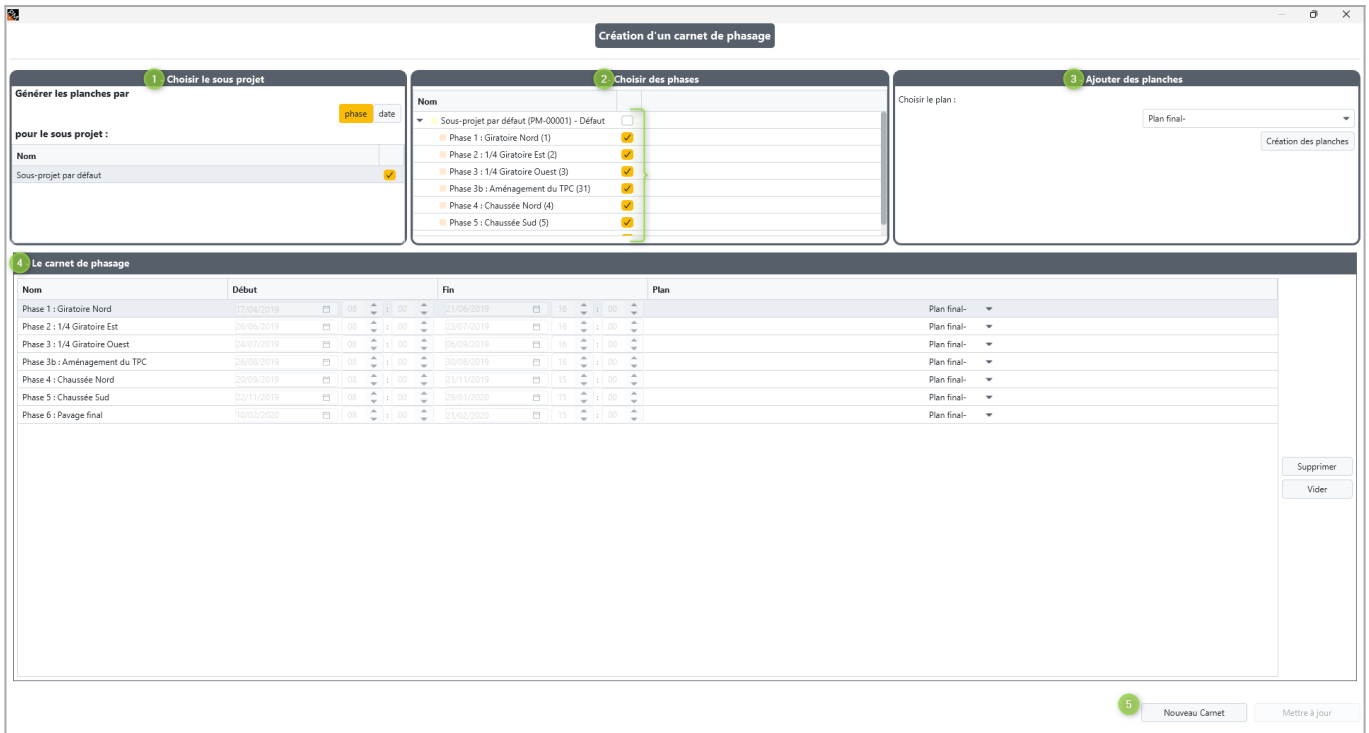
Etape 8 : Création et personnalisation du carnet de phasage

Nous arrivons à l'étape "finale". Les données sont dans Phase Manager, il ne vous reste plus qu'à en extraire les livrables de votre choix, pour analyser votre projet et vérifier sa faisabilité ou pour satisfaire la demande d'un tiers.

Vous allez créer un carnet de phasage. pour cela dirigez-vous sur le bouton  de votre navigateur latéral gauche.

Cliquez sur le bouton **+ Ajouter** situé en bas du panneau latéral gauche, et créez un carnet comme suit :

- 1) choisissez le sous-projet souhaité
- 2) cochez les activités récapitulatives correspondant aux phases du projet considéré
- 3) choisissez un fond de plan
- 4) remplacez si besoin le plan utilisé sur chaque planche



Création d'un carnet de phasage

1 Choisir le sous-projet

Générer les planches par

pour le sous projet :

Nom

Sous-projet par défaut

2 Choisir des phases

Nom

Sous-projet par défaut (PM-00001) - Défaut

- Phase 1 : Giratoire Nord (1)
- Phase 2 : 1/4 Giratoire Est (2)
- Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest (3)
- Phase 3b : Aménagement du TPC (31)
- Phase 4 : Chaussée Nord (4)
- Phase 5 : Chaussée Sud (5)

3 Ajouter des planches

Choisir le plan :

4 Le carnet de phasage

Nom	Début	Fin	Plan
Phase 1 : Giratoire Nord	17/04/2019	31/08/2019	Plan final-
Phase 2 : 1/4 Giratoire Est	26/06/2019	23/07/2019	Plan final-
Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest	24/07/2019	06/09/2019	Plan final-
Phase 3b : Aménagement du TPC	26/08/2019	30/08/2019	Plan final-
Phase 4 : Chaussée Nord	20/09/2019	21/11/2019	Plan final-
Phase 5 : Chaussée Sud	22/11/2019	20/01/2020	Plan final-
Phase 6 : Pavage final	10/02/2020	21/02/2020	Plan final-

5

- 5) "Nouveau Carnet" permet de créer le carnet.

Pour un carnet de phasage

Ajustez vos étiquettes

Le livrable étant créé, il est essentiel de le personnaliser. Commençons par manipuler les étiquettes.



Le dernier paramétrage accessible depuis cet onglet “Livvable” concerne les étiquettes. Vous allez pouvoir :

1. changer la taille de vos étiquettes(avec le + et le -),
2. changer l'affichage des liens entre étiquette et zone,
3. changer l'étiquette,
4. optimiser la position des étiquettes sur toutes les planches.

Étiquettes

Le positionnement des étiquettes a été optimisé pour l'ensemble des planches de votre phasage.


Sur la plupart des pages de votre livrable, vous constaterez que de nombreuses zones sont hachurées de plusieurs couleurs. La raison est simple, quand il existe plusieurs activités d'un métier différent sur une même zone pendant la même phase, les différentes couleurs de ces métiers s'affichent.

Intégrez votre frise


Dans un carnet de phasage il est utile de bien se repérer temporellement. La frise est là pour cela.

Dirigez-vous sur l'onglet « Planche » et glissez l'objet Frise sur la planche de votre première phase.

Depuis l'onglet “**Planche**” du panneau supérieur des livrables, il est possible de glisser sur les planches des objets comme les légendes de zones, les légendes d'état ou encore les frises.
Pour ajouter une frise, il faut glisser le bouton sur la planche d'un livrable.

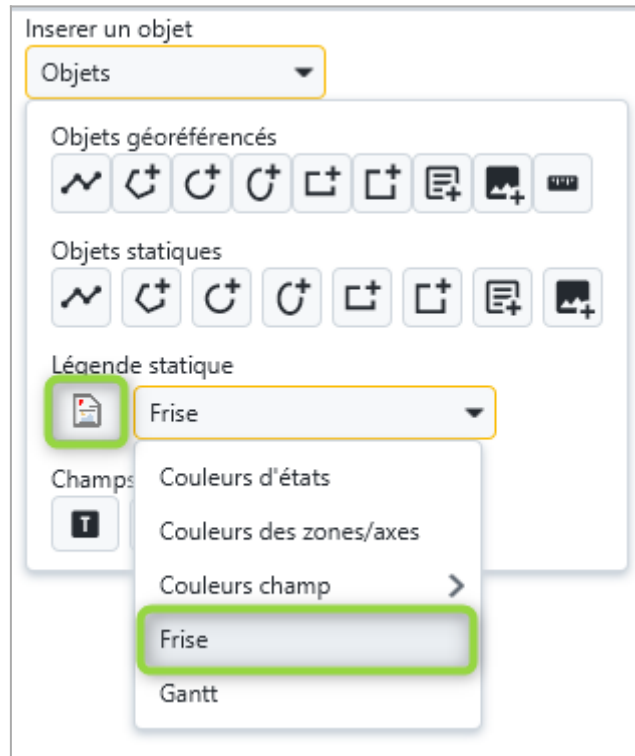


La frise étant ajoutée, il est possible de la redimensionner avec les curseurs de l'objet :

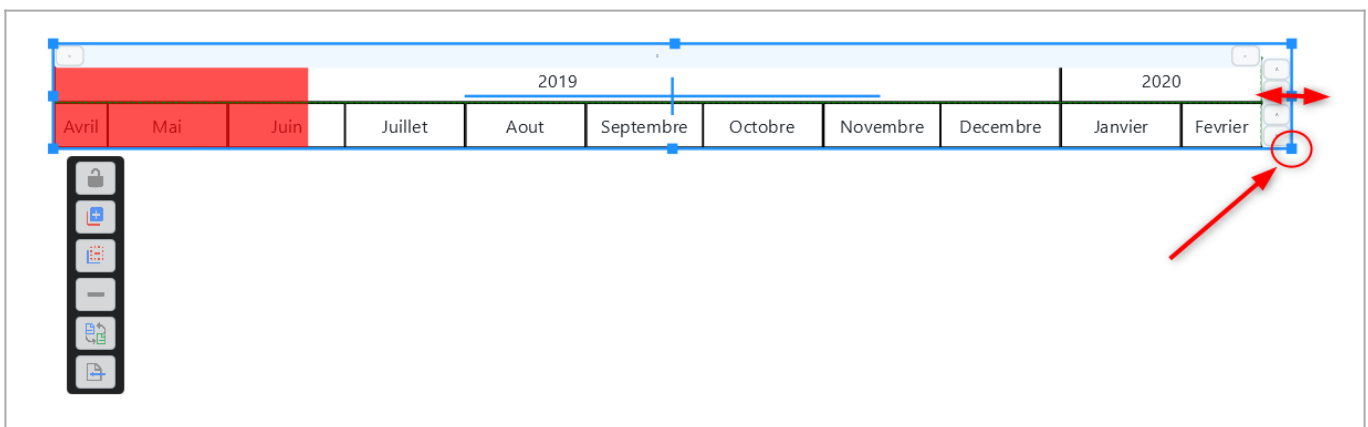


Par défaut, la période de la planche est surlignée en rouge et la période de toute la frise correspond à la période de votre livrable complet.

Pour modifier la couleur de la période surlignée, vous pouvez faire un clic droit sur la zone surlignée et aller

dans Paramètres :

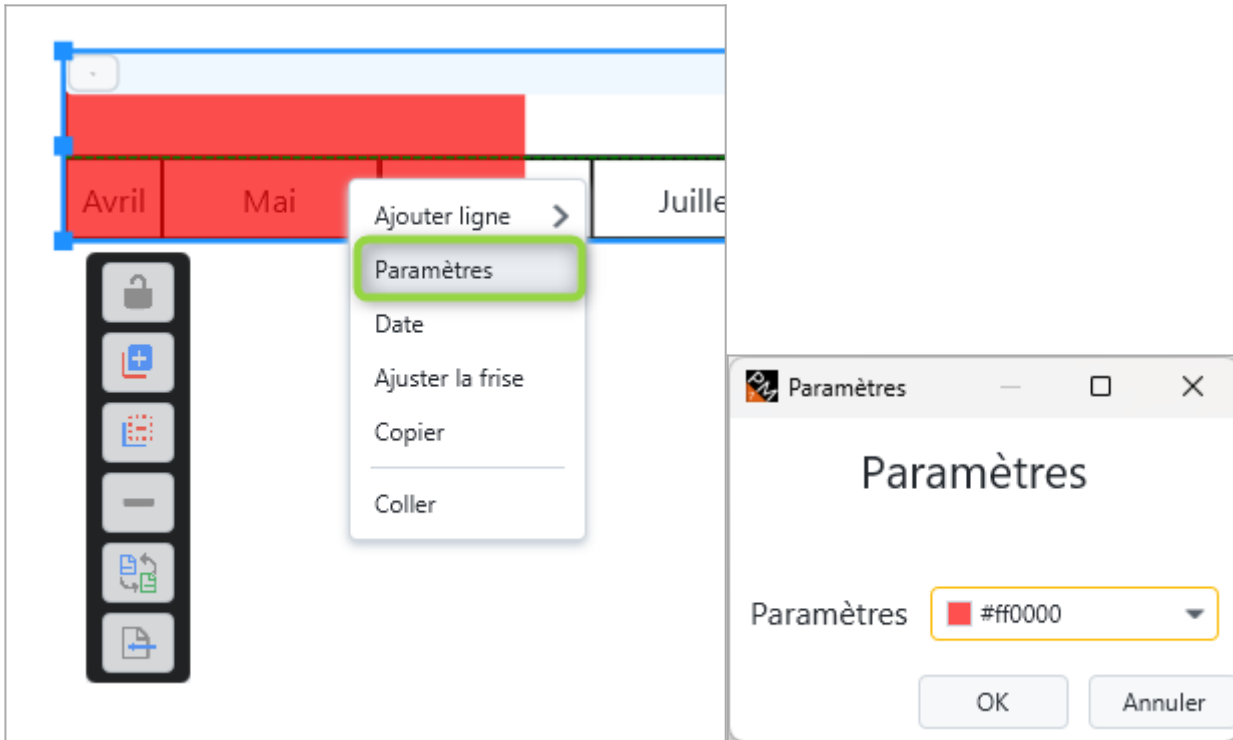


Pour personnaliser l'affichage des mois/semaines/jours, il faut faire un clic-droit dans le contour extérieur droit de la frise, en face d'une ligne existante, puis aller dans « Ajouter ligne » puis « Semaine » par exemple :

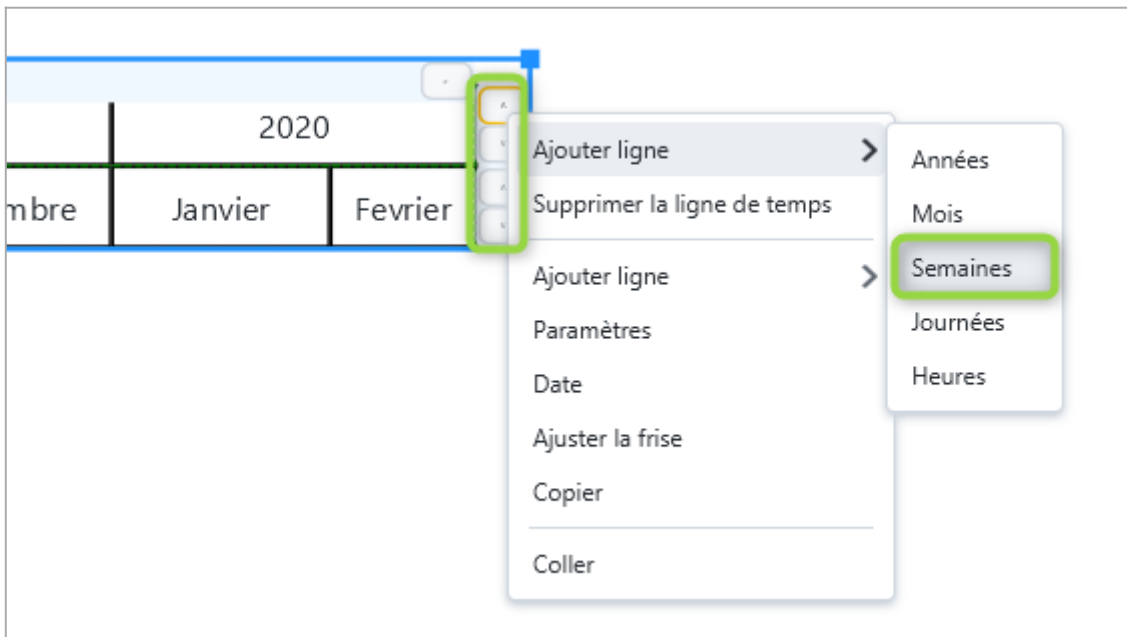

En répétant l'opération, il est possible d'obtenir le résultat suivant :

2020																																
Janvier																																
1					2							3							4							5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2

Il est possible de synchroniser la frise sur toutes les autres planches, en utilisant le bouton  situé au niveau du panneau vertical apparu lorsque vous avez sélectionné la frise.

[Insérer une frise](#)

Intégrez votre Gantt

Dans un carnet de phasage il est utile de bien visualiser les enchaînements entre les activités d'une même phase. Pour cela le Gantt est précieux.


Dirigez-vous sur l'onglet "**Planche**" et glissez l'objet Gantt sur la planche de votre première phase.

Automatiquement, le Gantt filtrera les activités concernées par la planche et zoomera sur la période de la planche.


Depuis l'onglet "**Planche**" du panneau supérieur des livrables, il est possible de glisser sur les planches un diagramme de Gantt afin de mieux visualiser les enchaînements entre les activités : depuis le menu "Insérer un objet" puis "Légende statique".

Une fois le diagramme de Gantt glissé, il est possible de procéder à sa personnalisation, en groupant ou triant les activités par exemple, en ajoutant des trames, des lignes de temps...

Pour grouper les activités, double-cliquez sur le Gantt puis faire un clic-droit dans l'en-tête des colonnes puis cliquer sur **Gestion des couleurs pour chaque niveau** :

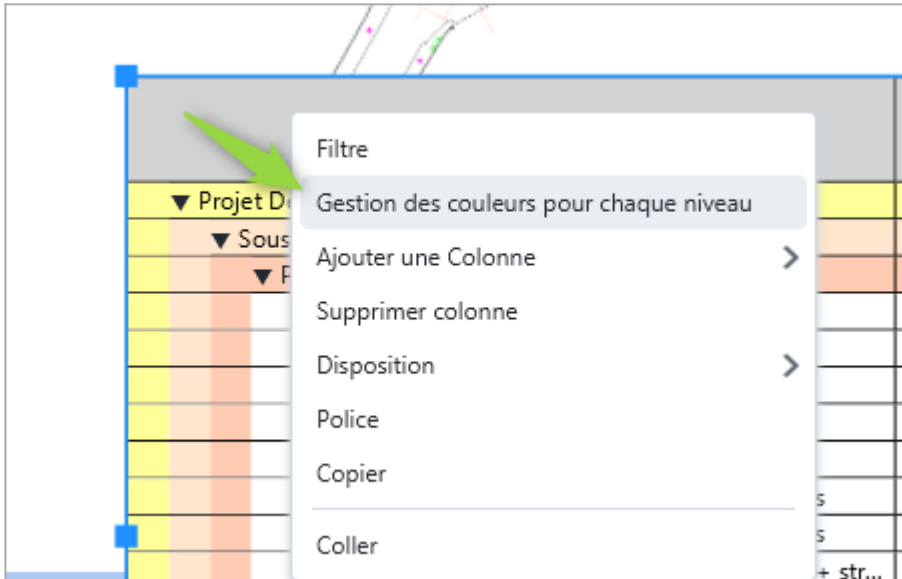

Dans la fenêtre qui s'affiche choisir les niveaux de groupements successifs souhaités, puis cliquer sur OK. Par exemple ici nous choisissons de grouper les activités par Zone. Pour mieux mettre en évidence les niveaux de groupements, il est également possible ici de choisir la couleur de chacun des niveaux :

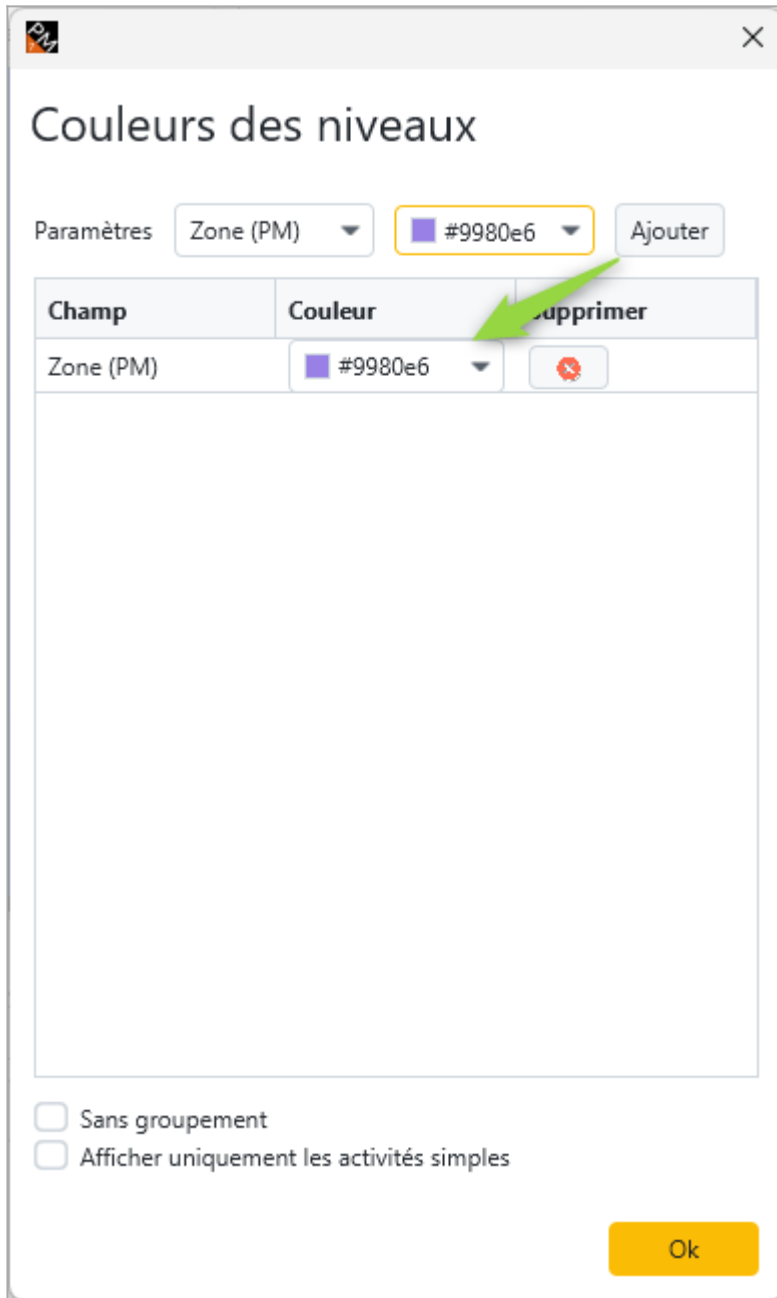

Grouper des activités

Un tri multicritères peut être appliqué sur autant de colonnes que souhaité, simplement en cliquant sur les en-têtes de colonnes. Par exemple ci-dessous, on a cliqué une fois sur “Début (PM)” et opéré un tri par dates de début croissantes :

Nom (PM)	ID (PM)	Début (PM) ▼
Phase 0 : Travaux préparatoires		
Installation de la base travaux	PM-00001	12/02/2018 08:00
Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord		
Installations et signalisation	2069	14/03/2018 08:00
Démolition bordures et pavés	2097	22/05/2018 08:00
Démolition bordures et pavés	10207	22/05/2018 08:00

L'ordre (croissant ou décroissant) du tri est marqué par le sens de la flèche noire. Si on clique une seconde fois sur "Début (PM)", on constate que l'activité la plus loin du projet est en première position, et que la flèche a changé de direction (un dernier clic sur l'en-tête aurait retiré le filtre) :

Nom (PM)	ID (PM)	Début (PM) ▲
Phase 6 : Pavage final		
Couche de roulement 3B (Circulatio...	3749	21/02/2019 08:00
Couche de roulement 3A (Circulati...	3777	14/02/2019 08:00
Signalisation et travaux préparatoires	3721	08/02/2019 08:00
Phase 5 : Chaussée Sud		
Revêtements trottoir	3413	25/01/2019 08:00

On constate également que l'ordre décroissant des dates de début a logiquement impacté l'ordre des phases. Pour conserver le groupement ordonné croissant des phases, il faudra appliquer deux tris successifs :

- cliquer sur l'en-tête de colonne "Phase (PM)" une fois
- et par exemple décider que le second critère de tri sera par date de fin décroissante en cliquant deux fois sur "Fin (PM)" :

Nom (PM)	ID (PM)	Début (PM)	Fin (PM) ▲▲	Phase (PM) ▼
Phase 0 : Travaux préparat...				
Installation de la base tra...	PM-00001	12/02/2018 08:00	13/03/2018 16:00	Phase 0 : Travaux préparato...
Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord				
Signalisation	2377	22/06/2018 14:10	22/06/2018 16:00	Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord
Revêtements trottoir	18859	22/06/2018 09:55	22/06/2018 16:00	Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord
Couche de base 3A (Circu...	2321	19/06/2018 08:00	22/06/2018 16:00	Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord
Couche de réglage / planie	2293	14/06/2018 08:00	15/06/2018 16:00	Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord

Le nombre de flèche indique le niveau du critère de tri (ici c'est d'abord par Phase, puis par date de Fin). A noter qu'il est possible de positionner autant de critères que nécessaires.

Trier des activités

Pour ajouter une colonne il faut effectuer sur un en-tête un **clic-droit > Ajouter une colonne** : après avoir sélectionné le champ à afficher, la nouvelle colonne va s'insérer à droite de la colonne sur laquelle on a cliqué. Pour supprimer une colonne il suffit d'effectuer un **clic-droit > Supprimer colonne** sur la colonne à retirer. Enfin pour **déplacer une colonne** : un simple glisser-déposer sur son en-tête permet de modifier sa position.

Ajouter/supprimer/déplacer des colonnes

L'ajout d'une ligne de temps s'effectue en faisant un **clic droit → Ajouter une ligne de temps** sur la ligne de temps qui sera située au-dessus de la ligne insérée. Ci-dessous on insère les numéros de semaine sous les mois :

2018																
Mars																
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Ajouter une règle de temps

L'affichage des trames s'opère en effectuant un clic droit sur la ligne de temps de son choix et en cliquant

sur “Afficher/Masquer la trame”.

Personnaliser l'affichage d'une trame s'effectue également en faisant un clic droit sur la ligne de temps de son choix et en allant dans “Propriétés”.


Afficher/modifier les trames

- **Insérer une légende**

Ajouter une légende s'opère de la même façon que pour ajouter une frise. Un glisser-déposer de la légende voulue sur la planche (depuis l'onglet “**Planche**” du panneau supérieur des livrables) suffit.

Insérer un diagramme de Gantt

Votre carnet de phasage est terminé, tout comme l'est presque ce tutoriel !

Vous pouvez désormais imprimer votre carnet de phasage en cliquant sur le bouton  puis en suivant les instructions [qui se trouvent ici dans la documentation](#).
